



ご近隣の皆さまへご報告させていただきます。

いつもありがとうございます。
御近隣で水道局による工期の要する工事（古い管の交替等）
をしております。お問い合わせも多くございました。
水道局より全体像含めて資料を取り寄せました。
ご報告いたします。ご参考になれば幸いです。

神戸市会議員 よこはた和幸

こうべ小学校周辺 排水管取替工事の状況（裏面位置図参照）

○再度筋他 配水管取替工事⇒青色

- ・古くなった配水管を取替えています。東から施工を開始し、現在、諏訪山公園前あたりまでの取替えが終わっています。
- ・舗装工事は東側の一部で舗装工事を行っております。その他に箇所は、取替えが全て終わってからになるため、舗装工事は年明けから実施予定です。


○山本通他 配水管取替工事⇒紫色

- ・古くなった配水管を取替えています。
- ・神戸小学校西側道路部分の取替工事は終わりました。舗装工事は年内の実施に向けて、工水（中部地区）PIP工事と調整を進めています。
- ・山麓線部分の工事は北側歩道の取替工事が完了し、これから南側工事に着手します。
- ・工事期間はR5.1.31となっていますが、1～2か月延期する見込みです。

○中部地区 PIP工事⇒赤および緑

- ・古くなった工業用水（工業のために使用する水道管。飲み水とは水質の異なる水が流れています）管を取替えています。
- ・赤色区間は道路を掘って管を布設します。緑色区間は既設の管の中に新しい管を挿入する工事です。
- ・今後、こうべ小学校西側道路では、10月に小学校西北の交差点～立坑（鉄板が敷いてある部分。）の開削工事を行います。また、12月から1月まで、No.1立坑から南側にPIP工事を行う予定です。立坑を1か所追加で施工します。
- ・舗装については、埋戻しの後時間を開けたいので3月以降になる予定です。

位置図 S=1:4000(A3)

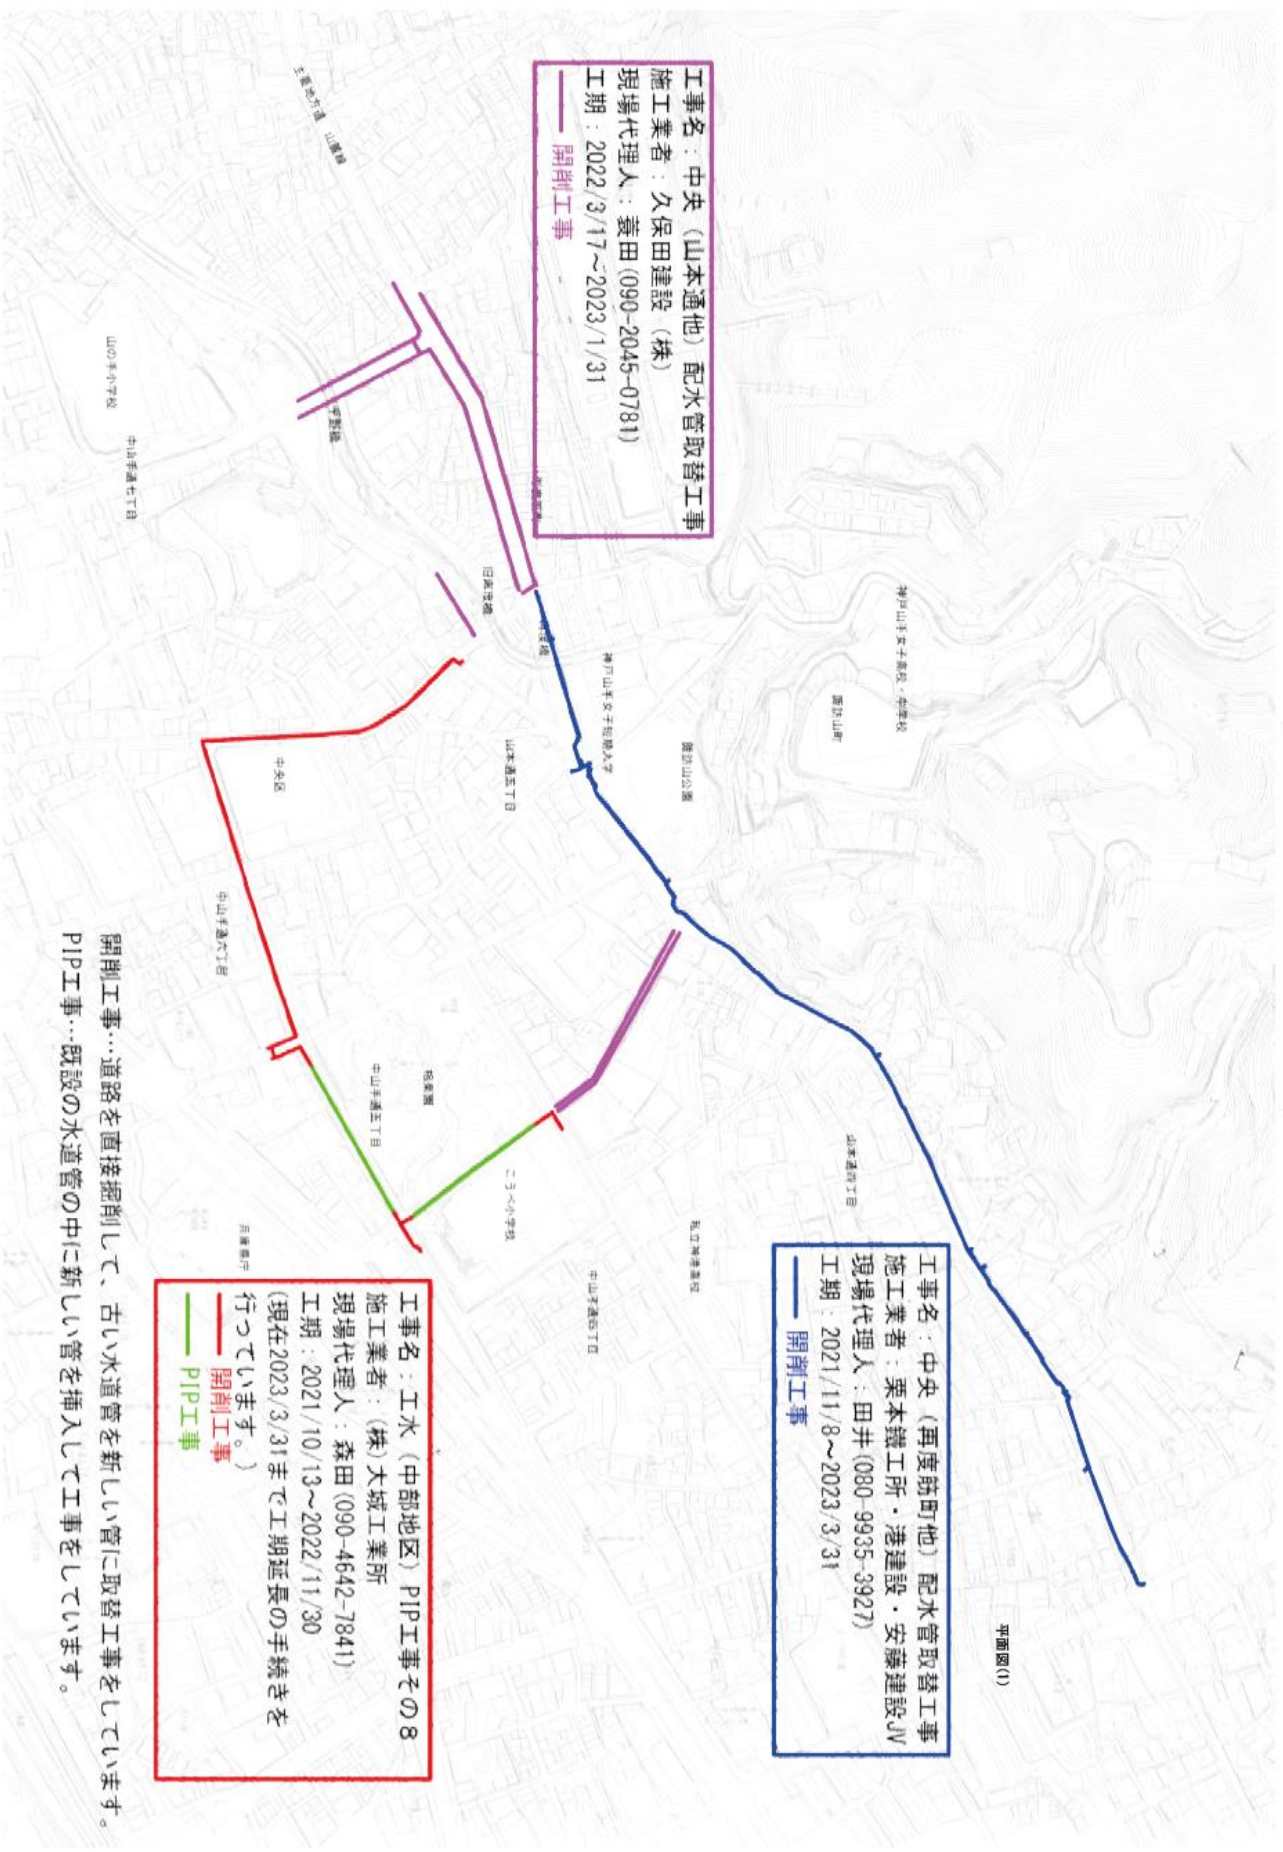

工事名：中央（山本通他）配水管取替工事
施工業者：久保田建設（株）
現場代理人：森田（090-2045-0781）
工期：2022/3/17～2023/1/31
— 開削工事

工事名：中央（再度筋町他）配水管取替工事
施工業者：栗本鐵工所・港建設・安藤建設JV
現場代理人：田井（080-9935-3927）
工期：2021/11/8～2023/3/31
— 開削工事

工事名：工水（中部地区）PIP工事その8
施工業者：（株）大城工業所
現場代理人：森田（090-4642-7841）
工期：2021/10/13～2022/11/30
 （現在2023/3/31まで工期延長の手続きを行っております。）
— PIP工事
— 開削工事

開削工事…道路を直接掘削して、古い水道管を新しい管に取替工事をしています。
 PIP工事…既設の水道管の中に新しい管を挿入して工事をしています。

平面図(1)
